

Nyhetsbrev för projekt High Coast

April 2025


Sedan vår senaste projektuppdatering har förberedelsearbetet vid parkerna fortskridit i hög takt. Under de senaste månaderna har vi nu färdigställt alla fundamentsgjutningar. Vi går nu även in i slutfasen av arbetet med kabeldragningar, vägbyggen och den omkringliggande infrastrukturen vid Vitberget och Sörlidberget. Samtidigt har leveranserna av turbinkomponenter startat, vilket är en stor milstolpe för oss och ett viktigt steg mot huvudarbetet med installationen av de fyra vindkraftsparkerna inom projekt High Coast. Vi kommer att fortsätta informera löpande om utvecklingen under våren. Parallellt med transporterna inleds nu det förberedande arbetet inför monteringen av vindkraftverken.

Uppdateringar för projektområdena

Under första kvartalet 2025 levereras turbindelarna till Köpmanholmens hamn och Härnösands hamn för vidare transport till vindkraftsparkerna.

Leveranserna från Köpmanholmen till Storhöjden pågår för fullt, och samtidigt fortsätter turbinkomponenterna att anlända till hamnarna. Därefter transporteras de vidare till de olika projekten inom projekt High Coast under våren.

Som en del av transportarbetet informerar RPC både allmänheten och berörda parter om eventuell påverkan.

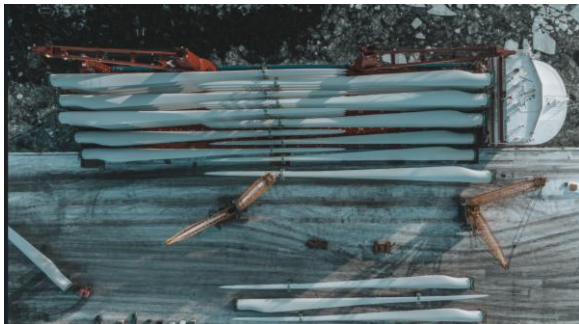

Det råder full aktivitet med transport av turbinkomponenter. Här ovan syns pålastning vid Köpmanholmens hamn för vidare transport till Storhöjden.

Knäsjöberget

För projekt Knäsjöberget (14 vindkraftverk) är förberedelserna för mottagandet av turbinkomponenterna avslutade. Detta inkluderar fundamentgjutningar, vägjusteringar, planarbeten och kabelförläggning.

De första transporterna av turbinkomponenter till Knäsjöberget startade under mitten av mars. Parallellt med att vi mottar turbinkomponenterna har vi även inlett förinstallationsfasen inför monteringen av vindkraftverken.

Vitberget

I projekt Vitberget, som omfattar 24 vindkraftverk, har vi nu gjutit det sista fundamentet.

Arbetet med kabeldragning har fortskridit och beräknas vara klart senare i vår. En stor del av väg arbetet och den omkringliggande infrastrukturen är färdigställd, och arbetet fortsätter under våren 2025. Leveranserna av turbinkomponenter beräknas starta runt mitten av maj.

Sörlidberget

För projekt Sörlidberget (20 vindkraftverk) är fundamentsgjutningarna helt klara. Endast de sista momenten återstår för kabeldragning och vägarbeten. RPC tackar för förståelsen kring trafikstörningar och den påverkan som dessa arbeten medför för allmänheten.

Leveranserna av turbinkomponenter beräknas starta omkring mitten av april, varefter förberedelserna inför monteringen av vindkraftverken påbörjas.

Storhöjden

För projekt Storhöjden, som omfattar 22 vindkraftverk, är arbetet med fundamentsgjutning och de kringliggande vägarna färdigt. Även kabeldragningen har pågått under vintern och är nu slutförd.

De första turbinkomponenterna levererades till Storhöjden i mitten av februari. Parallellt med mottagandet av leveranserna har vi nu även påbörjat

förinstallationsfasen inför monteringen av vindkraftverken. Arbetet med huvudinstallationen påbörjades i mitten av april.

Leveranser av turbindelarna under våren

Vi förbereder nu våra anläggningar för leverans och transport av turbinkomponenter. De första leveranserna inleddes i mitten av februari 2025 till Storhöjden, följt av leveranser till Knäsjöberget i mitten av mars, Sörlidberget i mitten av april och Vitberget i mitten av maj 2025.

Denna arbetsprocess kan medföra vissa störningar för lokalsamhället och närboende, men vi arbetar aktivt för att minimera dem i största möjliga mån.

Med vänliga hälsningar,



Andrés Iturriaga
Renewable Power Capital

M: +34 670 938 201

E: andres.iturriaga@renewablepowercapital.com



Tomas Pallin
Renewable Power Capital

M: +46 70 269 16 00

E: tomas.pallin@renewablepowercapital.com
